

新乡县小冀镇人民政府 2025 年高村农
村公益事业普惠性项目

第
三
方
验
收
报
告

鑫峰项管【2025】豫新第 1125-01 号

河南鑫峰工程咨询管理有限公司

2025 年 11 月 25 日

新乡县小冀镇人民政府 2025 年高村农
村公益事业普惠性项目

第
三
方
验
收
报
告

鑫峰项管【2025】豫新第 1125-01 号

河南鑫峰工程咨询管理有限公司

2025 年 11 月 25 日

目录

一、新乡县小冀镇人民政府 2025 年高村农村公益事业普惠性项目验收单位	3
二、新乡县小冀镇人民政府 2025 年高村农村公益事业普惠性项目验收报告	4
1. 验收照片	4
2. 检测资料	31
3. 验收结论	33

一、新乡县小冀镇人民政府 2025 年农村农村公益事业普惠性项目验收单位

统一社会信用代码
91410721MADQ6Y018N

营业执照
(副本)(1-1)



扫描二维码
下载国家企业信用信息公示系统APP
了解更多企业信用信息

名称 河南鑫峰工程咨询管理有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 李伟峰

经营范围 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑工程机械租赁；招投标代理服务；政府采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；农业机械服务；规划设计管理；水利相关咨询服务；承接档案服务外包；办公用品销售；办公设备材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；土地整治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属材料销售；建筑材料销售；电工仪器仪表销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业生产及辅助性活动；农业生产资料的购买、使用；农业生产托管服务；智能农业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2024年07月22日

住所 河南省新乡市新乡县七里营镇青年路815号一楼105号

登记机关 新乡县市场监督管理局

2024 年 07 月 22 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

二、新乡县小冀镇人民政府 2025 年高村农村公益事业普惠性项目验收报告

1、验收照片

(1) 1 号路





(2) 2号路





(3) 3号路







(4) 4号路






(5) 5号路

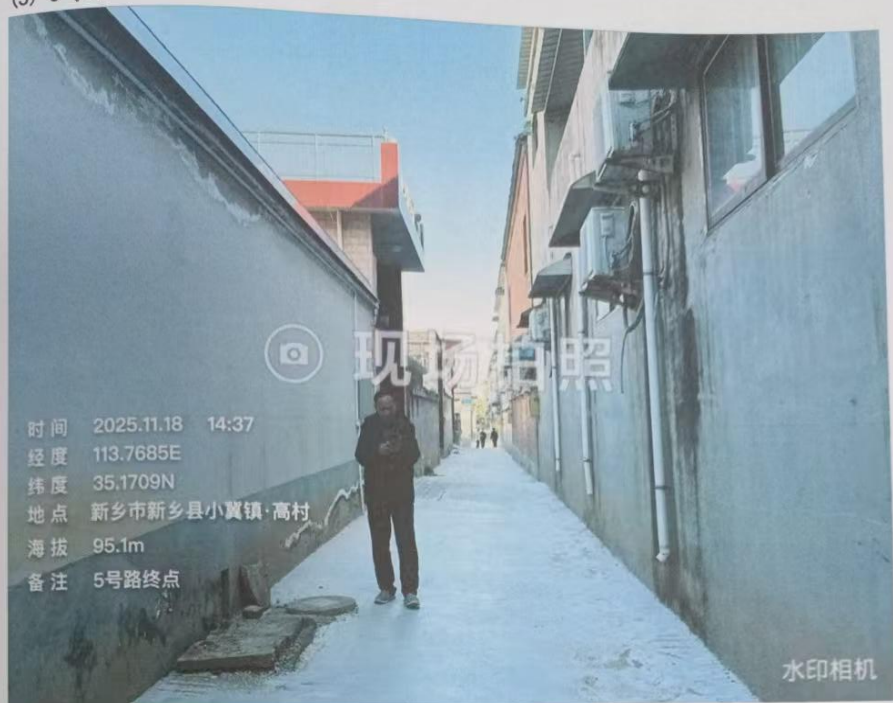

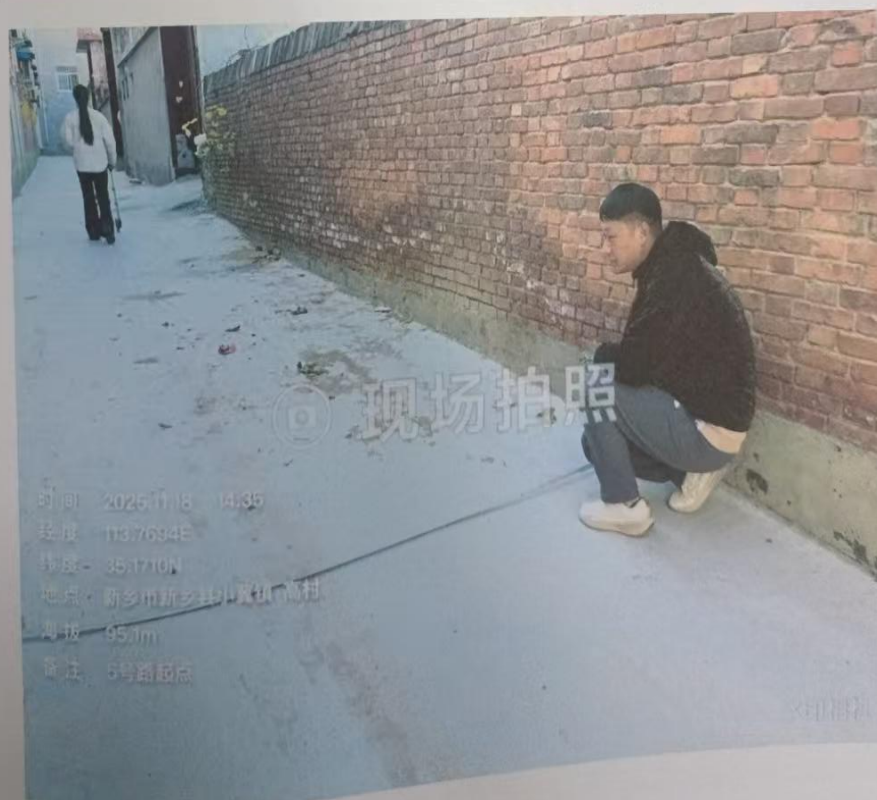


(6) 6号路



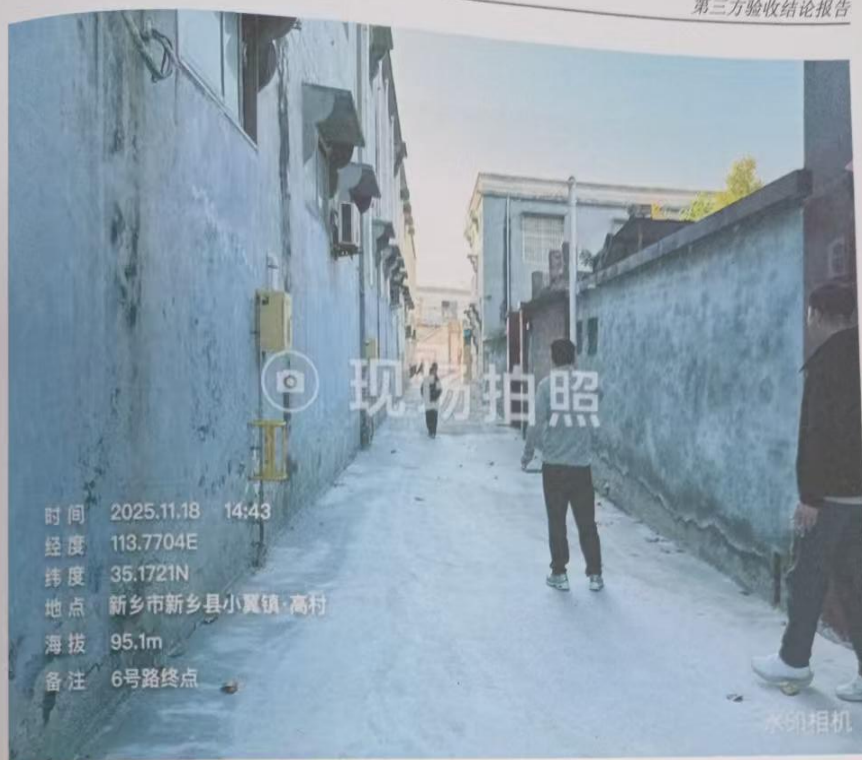

(7) 7号路

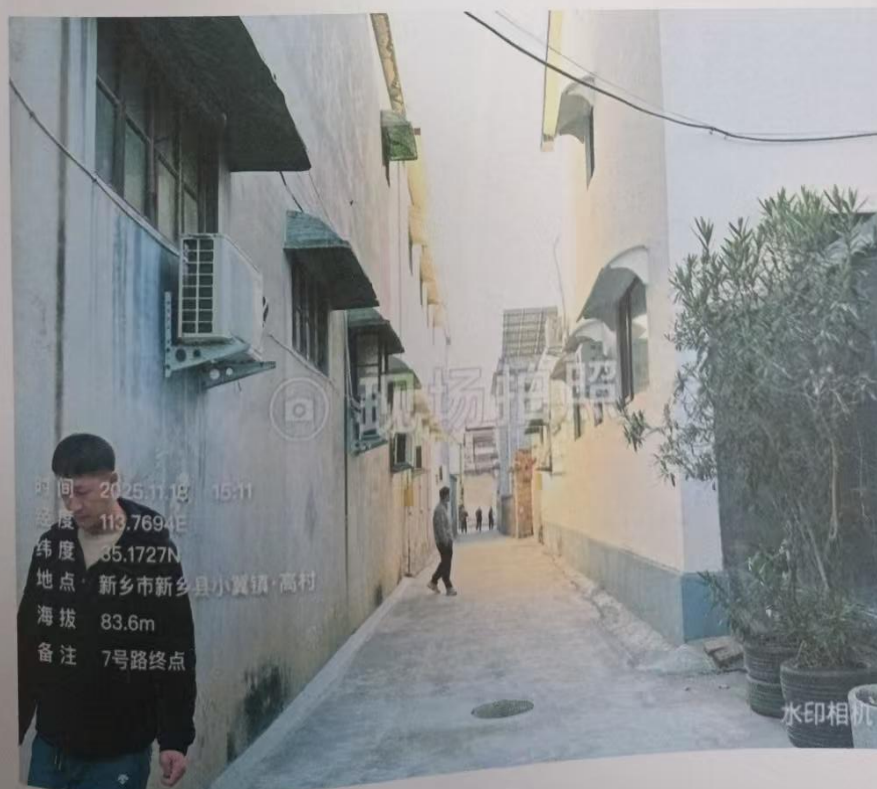



(8) 8号路





(9) 9号路




时间 2025.11.18 15:01
经度 113.7673E
纬度 35.1717N
地点 新乡市新乡县小冀镇·高村
海拔 85.1m
备注 9号路起点




时间 2025.11.18 15:03
经度 113.7673E
纬度 35.1716N
地点 新乡市新乡县小冀镇·高村
海拔 85.5m
备注 9号路终点

水印相机


(10)10号路


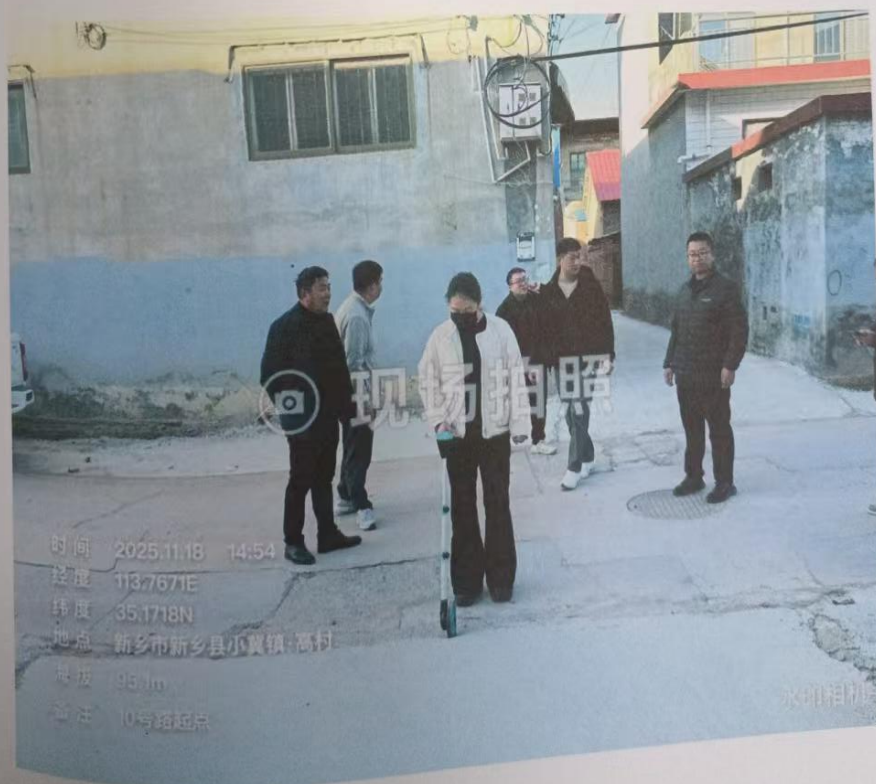


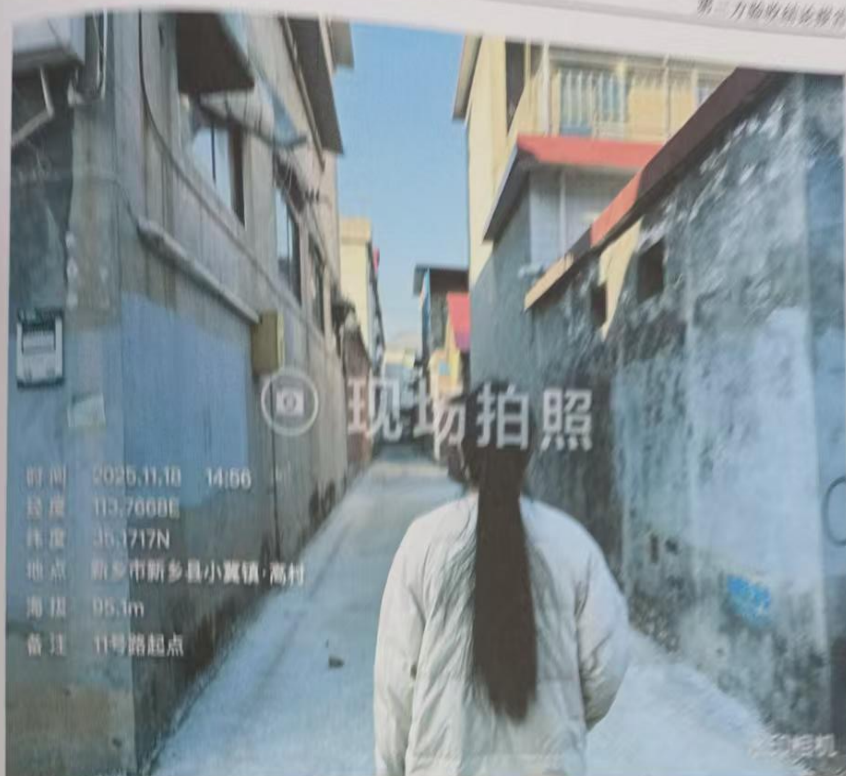

(12) 12 号路

验收结论报告

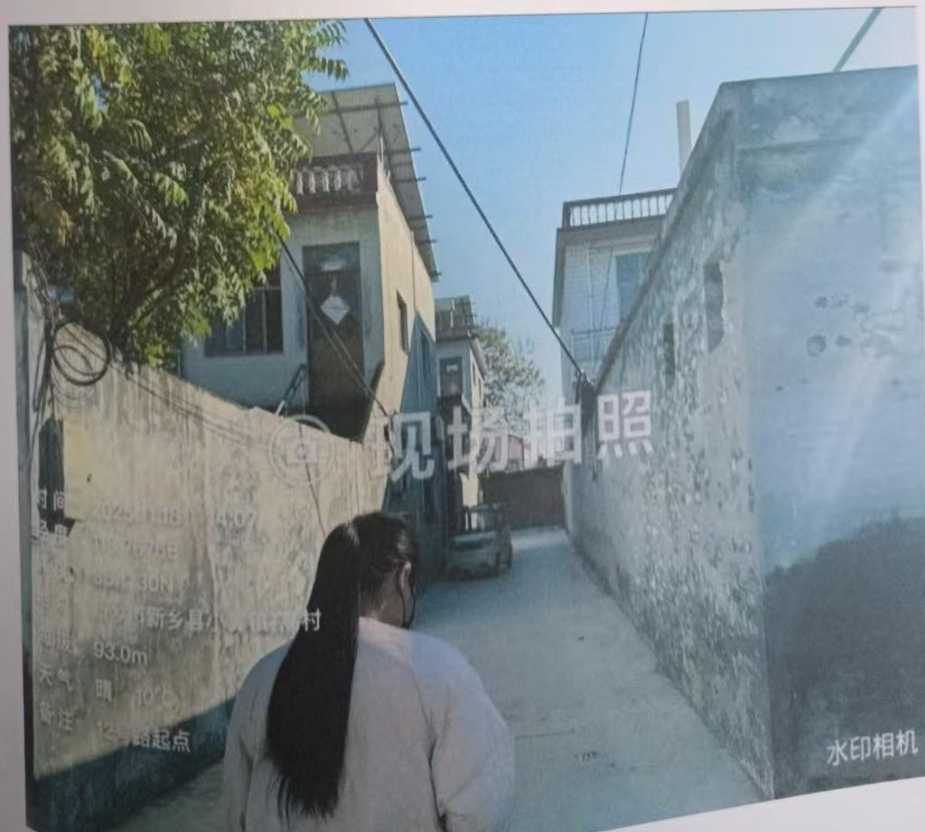

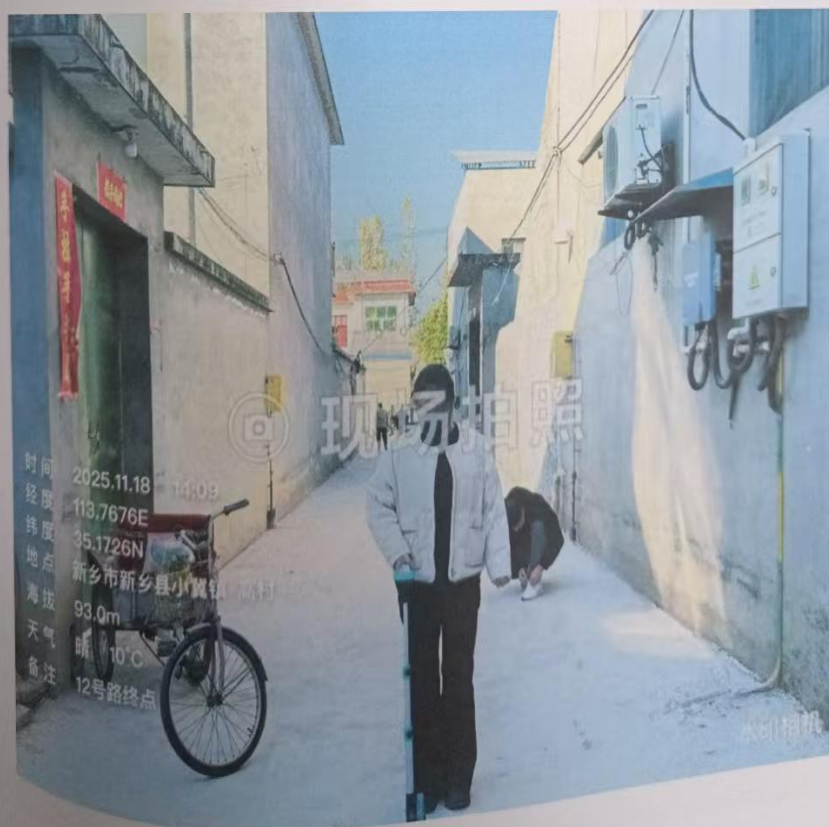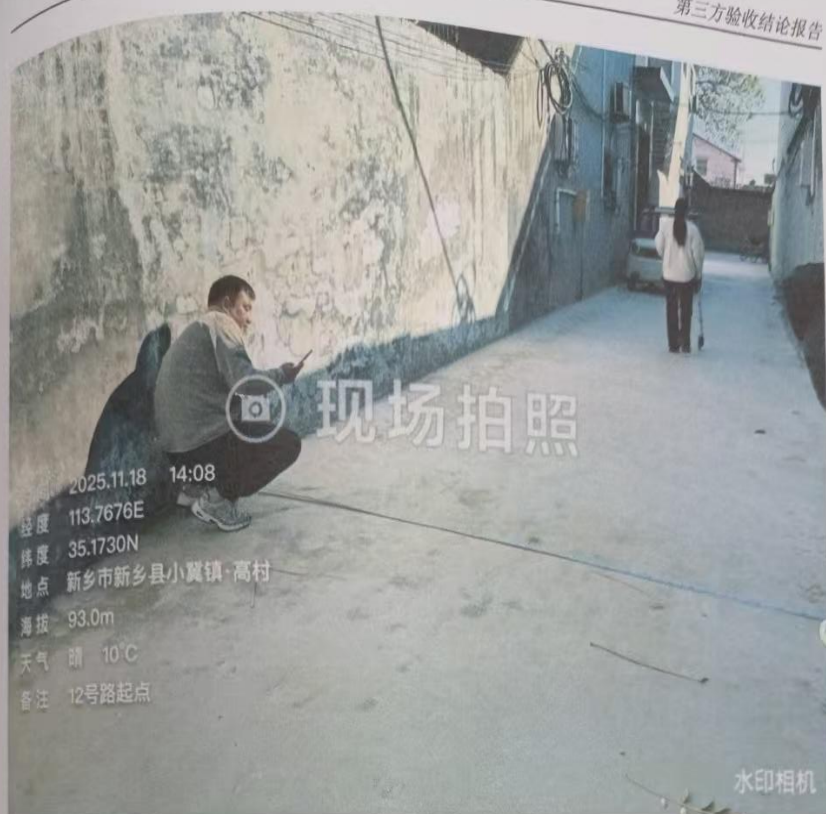


(13)13号路





(14) 14号路

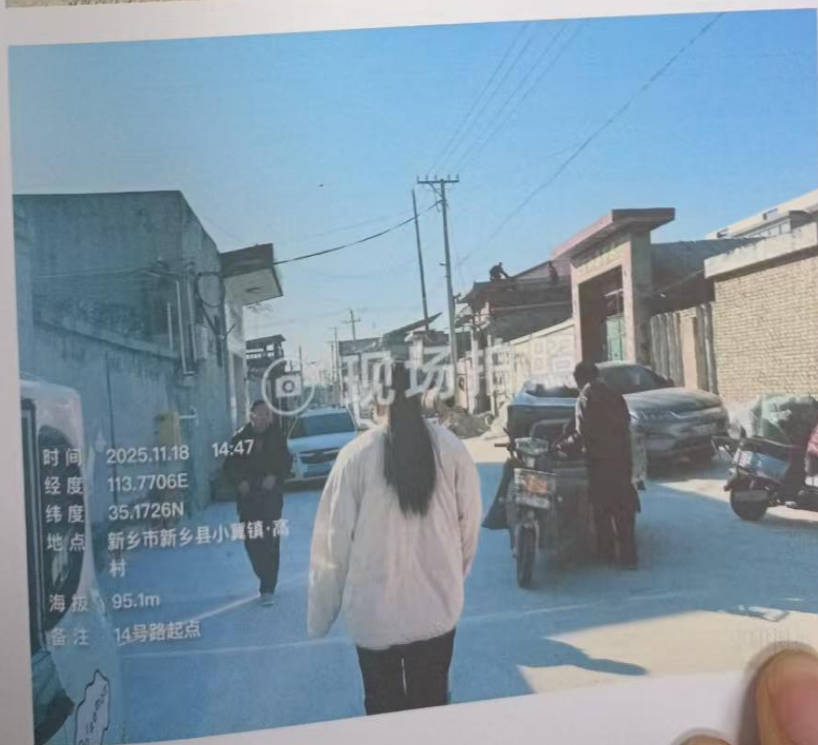



2. 检测资料



水泥混凝土路面芯样抗压强度报告 (钻芯法)



委托单位		世扬建设集团有限公司		工程名称		新乡县小冀镇人民政府2025年农村农村公益事业普惠性项目				
工程部位/用途		路面1号路、路面2号路、路面6号路、路面13号路								
样品信息		样品名称：混凝土芯样； 样品数量：4个； 样品编号：YP-2025GL-XYJ-1123001-01-04； 样品状态：完整、无蜂窝；								
检测依据		JTG 3450-2019、JTG 3420-2020			判定依据		JTG F80/1-2017、设计文件			
主要仪器设备名称及编号		自动岩石切割机GL01030001、游标卡尺GL0202001、电液伺服万能试验机GL02020002								
委托编号		WT-2025GL-1123001			检测类别		委托检测			
龄期（d）		-			设计强度等级		C25			
芯样编号		芯样状态		取芯位置		抗压强度测定值（MPa）		结果判定		
1123001-01		完整、无蜂窝		1号路		28.6		符合		
1123001-02		完整、无蜂窝		2号路		28.8		符合		
1123001-03		完整、无蜂窝		6号路		29.4		符合		
1123001-04		完整、无蜂窝		13号路		28.9		符合		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		
平均值		28.9	标准差	0.34	最小值	28.6	合格判定系数	1.15	合格判定系数	0.95
满足条件		平均值≥1.15倍的设计强度			满足		最小值≥0.95倍的设计强度		满足	
检测结论：		经检测，该路段所检参数符合《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）标准及设计文件要求。								
附加声明：		1. 报告无本单位“专用章”无效；报告无三级审核无效； 2. 报告改动、换页无效； 3. 委托试验检测报告仅对来样负责； 4. 未经本单位书面授权，不得部分复制本报告或用于其他用途； 5. 若对本报告有异议，应于收到报告15个工作日内向本单位提出书面复议申请，逾期不予受理。								
机构地址：		河南省新乡市牧野区107国道与新渡路交叉口西南角				邮编：	453000	联系电话：	0373-5086288	
								日期：2025年11月25日		

检测: 王瑞雪

审核: 

批准: 李和

日期: 1925 年 11 月 25 日



22160104101
有效期2028年12月31日

路面厚度试验检测报告（钻芯法）

第1页，共1页

公路试验报告 BGL001009P

报告编号: BG-2025GL-XYJ-1123001-01

委托单位	世扬建设集团有限公司			工程名称	新乡县小冀镇人民政府2025年高村农村公益事业普惠性项目
工程部位/用途	路面1号路、路面2号路、路面6号路、路面13号路				
样品信息	样品名称: 混凝土芯样; 样品编号: YP-2025GL-XYJ-1123001-01-04; 样品数量: 4个; 样品状态: 完整、无蜂窝;				
检测依据	JTG 3450-2019		判定依据	JTG F80/1-2017、设计文件	
主要仪器设备名称及编号	钢直尺GL02070009-1				
委托编号	WT-2025GL-1123001		检测类别	委托检测	
检测路段	-		混合料类型	水泥混凝土	
结构层次	面层		设计厚度 (mm)	-	
厚度实测值 (mm)					
编号	路面1号路	路面2号路	路面6号路	路面13号路	-
厚度	210	180	150	120	-
编号	-	-	-	-	-
厚度	-	-	-	-	-
编号	-	-	-	-	-
厚度	-	-	-	-	-
厚度 评定	检测点数	4	厚度平均值 (mm)	-	
	最小值 (mm)	-	标准差S (mm)	-	
	厚度代表值XL (mm)	-	保证率 $t_a/\sqrt{n}$	-	
	代表值允许偏差 (mm)	-	单点合格值允许偏差 (mm)	-	
	合格点数: 一点, 合格率-%。				
检测结论:	经检测, 该路段所检厚度实测值见上表。				
附加声明:	1. 报告无本单位“专用章”无效; 报告无三级审核无效; 2. 报告改动、换页无效; 3. 委托试验检测报告仅对来样负责; 4. 未经本单位书面授权, 不得部分复制本报告或用于其他用途; 5. 若对本报告有异议, 应于收到报告15个工作日内向本单位提出书面复议申请, 逾期不予受理。				
机构地址:	河南省新乡市牧野区107国道与新濮路交叉口西南角		邮编:	453000	联系电话: 0373-5086288

检测: 王瑞

审核: 赵峰

批准: 李红

日期: 2025年11月15日

3、验收结论

第三方验收结论报告

项目名称	新乡县小冀镇人民政府 2025 年高村农村公益事业普惠性项目
建设单位	新乡县小冀镇人民政府
施工单位	世扬建设集团有限公司
监理单位	元叁咨询有限公司
验收日期	2025 年 11 月 25 日

验收结论:

建设单位、施工单位、监理单位和河南鑫峰工程咨询管理有限公司共同参与,对新乡县小冀镇人民政府 2025 年高村农村公益事业普惠性项目进行验收,验收结论如下:

序号	长 (m)	宽 (m)	厚 (cm)	面积 (m²)
1 号路	266	8.95	18	2380.7
	37.5	8.95	21	335.625
2 号路	273.8	6	18	1642.8
3 号路	28.6	3.91	15	111.826
4 号路	4.6	6.1	15	28.06
5 号路	63.5	3.01	15	191.135
6 号路	66.7	3.86	15	257.462
7 号路	62.1	3.01	15	186.921
8 号路	50.6	2.41	12	121.946
9 号路	18.3	2.35	12	43.005
10 号路	39.3	3	15	117.9
11 号路	65.5	2.95	15	193.225
12 号路	46.7	3.83	15	178.861
13 号路	9.9	3.9	12	38.61
	45.2	3.5	12	158.2
14 号路 (东段)	65.7	4.95	15	325.215
14 号路 (西段)	126.9	5.6	18	721.84
合计			12	361.76
			15	1590.605
			18	4745.34
			21	335.62

设计工程量 C25 水泥混凝土 (厚 12cm), 259.4 m³; C25 水泥混凝土 (厚 15cm), 1586.7 m³; C25 水泥混凝土 (厚 18cm), 4494 m³; C25 水泥混凝土 (厚 21cm), 333 m³。

实际完成工程量 C25 水泥混凝土 (厚 12cm), 361.76 m³; C25 水泥混凝土 (厚 15cm), 1590.6 m³; C25 水泥混凝土 (厚 18cm), 4745.34 m³; C25 水泥混凝土 (厚 21cm), 335.62 m³。

符合工程量清单要求。

验收人员

李西

第三方验收单位 (盖章):

2025 年 11 月 25 日

4107002317410

