



滑县乡镇(街道)村级综合文化服务中心
广场戏台建设改造升级项目三标段

第三方验收报告

河南恒诺工程检测有限公司

二零二四年十二月



滑县乡镇(街道)村级综合文化服务中心
广场戏台建设改造升级项目三标段

第三方验收报告

河南恒诺工程检测有限公司

二零二四年二月



注 意 事 项

1. 报告无“报告专用章”、“骑缝专用章”或检测单位公章无效。
2. 复印报告未重新加盖“报告专用章”、“骑缝专用章”或检测单位公章无效。
3. 报告涂改无效。
4. 自 2024 年 4 月 18 日起，报告无防伪标及撕毁无效。
5. 对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向公司提出，逾期视为对报告无异议。
6. 本次报告仅对所抽检部分负责。

受滑县文化广电体育旅游局委托，我单位组织相关技术人员于2024年9月2日，按照委托要求对滑县乡镇(街道)村级综合文化服务中心广场戏台建设改造升级项目三标段进行一般项目验收。

一、工程概况

1、滑县乡镇(街道)村级综合文化服务中心广场戏台建设改造升级项目三标段，该项目位于大寨乡:小田村，高平镇:西起寨，牛屯镇:东杨庄，留固镇:第三营，上官镇:关帝庙村。主要工程内容为地面硬化工程。

2、参建单位

建设单位：滑县文化广电体育旅游局

施工单位：河南圣本市政工程有限公司

监理单位：中誉恒信工程咨询有限公司

本项目各项验收均由业主单位组织、各参建单位实施监督，数据检测及结果判定依据国家及行业相关标准、设计文件和施工合同进行。

二、测量依据及规范

《工程测量规范》(GB50026-2020)

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03-2007)

本项目相关文件

三、测量项目频率及方法

1、测量项目

(1) 地面硬化面积

2、测量频率

本次测量项目按照相关规范的要求和方法进行测量，测量数据按照有关规程规定的方法计算：长度、宽度采用推尺及钢卷尺进行测量。

四、验收仪器设备

序号	检测项目	仪器名称	型号	数量	状态
1	宽度	钢卷尺	10m	2	正常
2	长度、面积	推尺	/	2	正常
		GPS 测量仪	华测	1	正常
3	直径	围尺	2m	1	正常
4	厚度	取芯机	/	1	正常

五、实地测量统计结果

工程名称		滑县乡镇(街道)村级综合文化服务中心广场戏台建设改造升级项目三标段		
验收项目		地面硬化面积		
建设单位		滑县文化广电体育旅游局		
规范名称及编号		《工程测量规范》(GB50026-2020)		
验收人员		汤猛、吕起航		
验收项目		检查项目	数量	备注
1	大寨乡小田村	地面硬化面积	1000 m²	厚 12.0cm
2	高平镇西起寨	地面硬化面积	378 m²	厚 12.0cm
3	牛屯镇东杨庄	地面硬化面积	700 m²	厚 12.0cm
4	留固镇第三营	地面硬化面积	1000 m²	厚 12.0cm
5	上官镇关帝庙村	地面硬化面积	1050 m²	厚 12.0cm

六、检测结论

(1) 大寨乡小田村地面硬化强度采取芯样加工后试验检测，共 1 组芯样检测，抗压强度大于 20Mpa，混凝土地面设计抗压强度符合设计及验收规范要求。

(2) 高平镇西起寨地面硬化强度采取芯样加工后试验检测，共 1 组芯样检测，抗压强度大于 20Mpa，混凝土地面设计抗压强度符合设计及验收规范要求。

(3) 牛屯镇东杨庄地面硬化强度采取芯样加工后试验检测，共 1 组芯样检测，抗压强度大于 20Mpa，混凝土地面设计抗压强度符合设计及验收规范要求。

(4) 留固镇第三营地地面硬化强度采取芯样加工后试验检测，共 1 组芯样检测，抗压强度大于 20Mpa，混凝土地面设计抗压强度符合设计及验收规范要求。

(5) 上官镇关帝庙村地面硬化强度采取芯样加工后试验检测，共 1 组芯样检测，抗压强度大于 20Mpa，混凝土地面设计抗压强度符合设计及验收规范要求。

七、验收结论

以上数据为滑县乡镇(街道)村级综合文化服务中心广场戏台建设改造升级项目三标段实际测量工程量,由甲方、施工方、第三方共同确认,对所检项目的质量进行综合评定。

验收人员签字: 吕超航 杨猛

河南恒诺工程检测有限公司

2024年12月24日

报告专用章

第三方验收廉政告知书

为加强企业的廉政建设,规范工作中的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护公司和员工的合法权益,净化公司的管理环境,努力提高全体员工的思想素质,增强自我防御能力、抵制社会不良风气的污染,遵守国家各项法律法规及公司各项规章制度。


我公司作为专业的第三方公司,是一家独立的第三方综合检测机构,为公开,公平,公正,廉洁,高效做出不懈的努力。我们秉承的企业文化是严禁利用职权向业务单位“吃、拿、卡、要”,严惩腐败,拒绝贿赂,做绝对中立的第三方。为了我们企业更好的成长,恳请广大企业客户严密的监视我们,在服务中如有不足部分请提出宝贵的意见,我们非常感谢您的每一次质疑,将给我们带来成长的机会。

如果发现我们的工作人员有索贿受贿现象,态度恶劣,没有致力于验收工作,请第一时间举报给我们公司,我们会第一时间处理,严惩受贿人员。

谢谢合作!



附件 1：现场照片

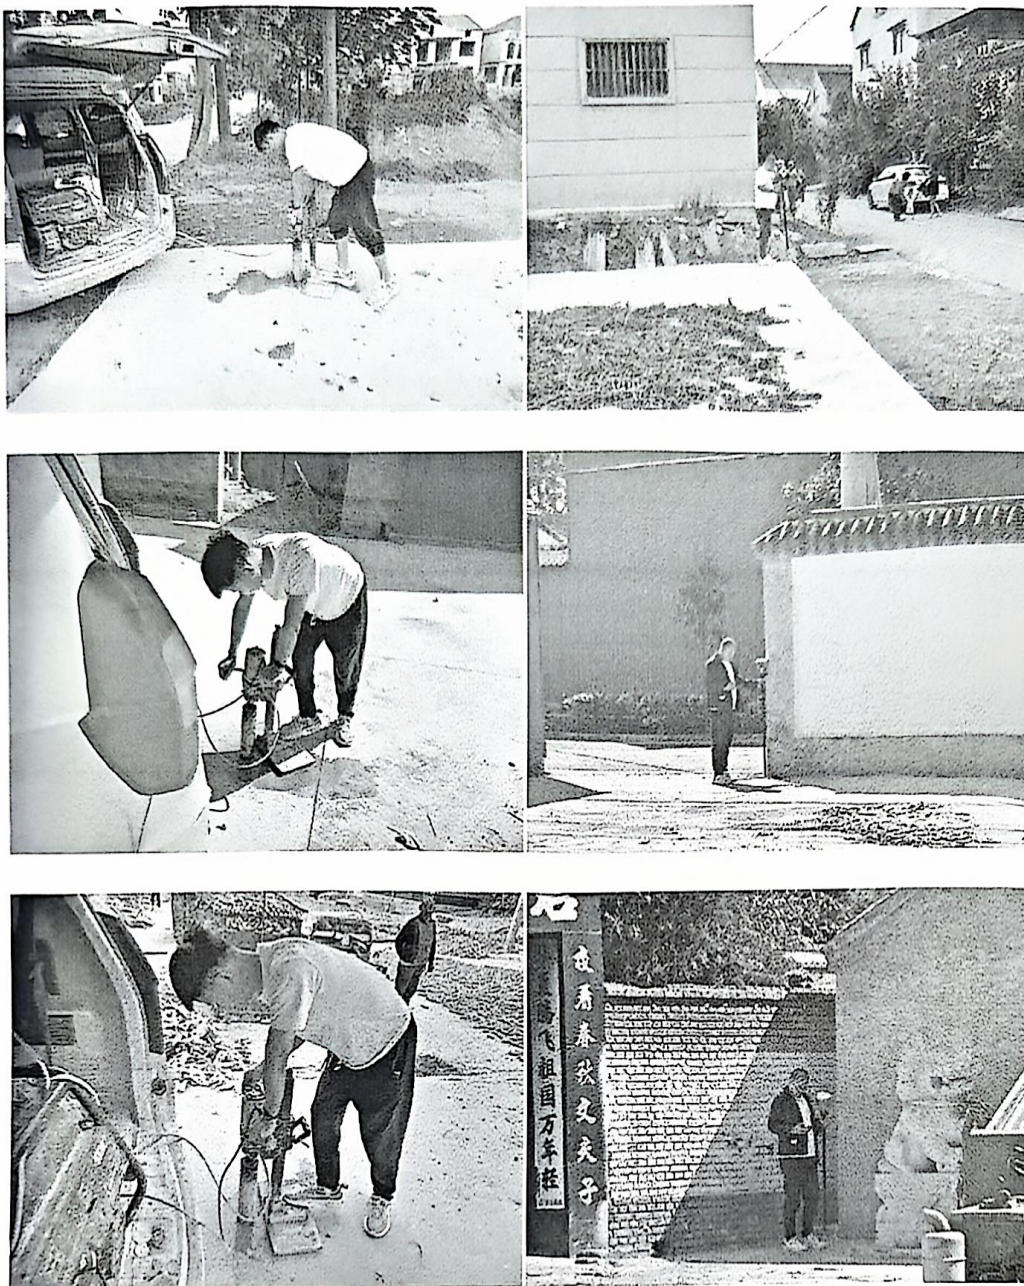

附件 2：单位资质

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息、
备案、许可、监
管信息。

统一社会信用代码
91410626MA46B372J

营业执照

(副本) (1-1)

名称 河南恒诺工程检测有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王少党

注册资本 叁佰万圆整

成立日期 2019年01月14日

营业期限 长期

经营范围 市政工程检测、公路工程检测、绿化工程检测、建筑工程检测、空气环境检测、土壤检测、水文水质分析。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 河南省安阳市滑县新华二路南段南侧6号

登记机关

2019 年 08 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



检验检测机构
资质认定证书

证书编号：201601060142

名称：河南恒诺工程检测有限公司

地址：河南省安阳市滑县新华二路南段南侧6号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



201601060142
2020年06月16日

发证日期：2020年06月17日

有效期至：2023年06月16日

发证机关：河南省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。



建设工程质量检测机构

资质证书

证书编号：豫 建检字第 05201 号

中华人民共和国建设部制

机构名称：河南恒诺工程检测有限公司

检测范围：见证取样检测



发证机关：



发证日期：2020年11月17日

有效日期：2023年11月17日

基本存款账户信息

账户名称： 河南恒诺工程检测有限公司

账户号码： 41050160630800001257

请
照
此
印
发
一

开户银行： 中国建设银行股份有限公司滑县支行

法定代表人： 王少党
(单位负责人)

基本存款账户编号： J4964001666802

2021年11月10日
